



INFORME EJECUTIVO

AVANCES OBTENIDOS POR LA INICIATIVA CoST

GUATEMALA

EN TÉRMINOS DE LOS NIVELES DE DIVULGACIÓN DE

LOS INDICADORES CoST

INTRODUCCIÓN

La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción, CoST, promueve la divulgación de información estándar de proyectos de infraestructura, como mecanismo para transparentar la inversión pública y fomentar la rendición de cuentas, en todos los países con adhesión a CoST.

Por lo anterior es que la Iniciativa CoST capítulo Guatemala, ha sido reconocida internacionalmente por convertirse en pionera a nivel latinoamericano, debido a la institucionalización de indicadores de información estándar de infraestructura pública de CoST.

En el presente informe ejecutivo, se presentan los resultados obtenidos del monitoreo de entidades y concursos en el portal de contrataciones y adquisiciones del Estado, en términos de los niveles de cumplimiento en cuanto a la publicación de los documentos que se requieren para la validación de los Indicadores CoST.

ANTECEDENTES

Durante el año 2014, la incidencia de la Iniciativa CoST en Guatemala, cobro auge, ya que con el apoyo de la Champion de la Iniciativa, Excelentísima Vicepresidenta de la República de Guatemala y de la Presidenta y Miembros del Grupo Multisectorial, fue posible introducir la metodología de divulgación obligatoria en materia de infraestructura pública, al sistema de rendición de cuentas del Estado, a través del artículo 20, inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, vigente desde el 03 de enero de 2014.

En seguimiento a ésta importante normativa, las autoridades de la Iniciativa introdujeron de forma específica los Indicadores CoST en la categoría de construcción del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado –Guatecompras, a través de la Resolución 01-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual exige la publicación de documentos y datos relacionados a la contratación, ejecución y liquidación de proyectos de infraestructura pública, la cual deberá ser cumplida por todas las

entidades que inicien procesos de contratación y ejecución de obra pública, logrando con ello establecer un cambio trascendental en los mecanismos de transparencia en la materia.

PRODUCTOS OBTENIDOS DEL MONITOREO DE CONCURSOS EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS

PERIODO DE EVALUACIÓN

El periodo de evaluación comprendió las cuatro semanas del mes de enero de 2015.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Se realizaron nueve pasos previos al monitoreo de concursos en el portal de Guatecompras, los cuales se describen a continuación:

Paso 1: Se establecieron los parámetros de búsqueda de concursos en el portal de Guatecompras.

Tipo de entidad:Sector Público

Subtipo de entidad:Administración central, entidades descentralizadas y autónomas, Municipalidades, Mancomunidades, Empresas públicas.

Categoría del concurso:Construcción y materiales afines.

Modalidad de compra:Cotización y licitación

Tipo de Concurso:Público

Recepción de ofertas:En papel y electrónicas

SNIP:Con SNIP

Status: Terminado adjudicado

Fecha: De publicación

Paso 2: De acuerdo a la aplicación de los parámetros del paso 1, se obtuvo el universo de proyectos y entidades a evaluar en el cumplimiento de publicación de indicadores.

Paso 3: Se determinó la cantidad de entidades y concursos publicados en el periodo correspondiente de la evaluación.

Paso 4: Se creó una hoja Excel con la importación de datos del portal Guatecompras, para hacer la distribución de concursos por entidades, entre los dos Ingenieros consultores del equipo de aseguramiento de CoST.

Paso 5: Se verificó la publicación de los documentos para cada indicador CoST, por la entidad de adquisición para cada concurso.

Paso 6: Se hizo constar en la ficha técnica proporcionada por la Comisión Presidencial, los indicadores publicados y no publicados, en base a los criterios siguientes:

- Los concursos que llegaron al paso de recepción de ofertas, deberán cumplir con los 8 indicadores de Pre Contrato (del 1 al 8) y 9 de Contrato (del 9 al 18 excepto el 15).
- Los concursos adjudicados deberán cumplir con los 8 indicadores de Pre Contrato (del 1 al 8) y 10 de Contrato (del 9 al 18).
- Los concursos contratados deberán cumplir con los 8 indicadores de Pre Contrato (del 1 al 8) y 14 de Contrato (del 9 al 22).

Paso 7: Consolidación de la información de los concursos por entidad y obtención promedio de cumplimiento de publicación de indicadores por cada entidad.

Paso 8: Se diseñó la gráfica de cumplimiento mensual por entidad.

Paso 9: Se presentaron los resultados obtenidos y las recomendaciones.

ENTIDADES CON PUBLICACIÓN DE CONCURSOS EN GUATECOMPRAS

Las entidades que publicaron concursos en la categoría de construcción del portal de Guatecompras durante el período de evaluación, fueron veintiocho, todas pertenecientes a gobiernos locales de trece departamentos:

- Chimaltenango
- San Marcos
- Jutiapa
- Huehuetenango
- Quetzaltenango
- Retalhuleu
- Sololá
- Suchitepéquez
- Escuintla
- Jalapa
- Peten
- Santa Rosa
- Alta Verapaz

ENTIDADES CON PUBLICACIÓN DE CONCURSOS EN GUATECOMPRAS:


No	Entidad	NO
1	MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO	1
2	MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS	2
3	MUNICIPALIDAD DE EL ADELANTO, JUTIAPA	2
4	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	2
5	MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO	1
6	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	7
7	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO	1
8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ	1
9	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ	1
10	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	1
11	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ	1
12	MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	1
13	MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS, PETÉN	1
14	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	6
15	MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	1
16	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETEN	2
17	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO	2
18	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA	1
19	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA	1
20	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	5
21	MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ	3
22	MUNICIPALIDAD DE SIPACAPA, SAN MARCOS	1
23	MUNICIPALIDAD DE SOLOLA, SOLOLA	2
24	MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	1
25	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, HUEHUETENANGO	1
26	MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ	6
27	MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA	1
28	MUNICIPALIDAD DE ZAPOTITLAN, JUTIAPA	1
	TOTAL	56

GRAFICA DE ENTIDADES CON PUBLICACIÓN DE CONCURSOS EN GUATECOMPRAS

En la siguiente gráfica se puede observar que de las veintiocho entidades, veinticinco publicaron en promedio, uno a dos concursos.

Las cinco entidades que sobresalieron por publicar una mayor cantidad de concursos fueron:

- Municipalidad de Retalhuleu (siete concursos)
- Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez San Marcos (seis concursos)
- Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla (cinco concursos)
- Municipalidad de Santo Tomas La Unión, Suchitepéquez (tres concursos)
- Municipalidad de Tucuru, Alta Verapaz (seis concursos)

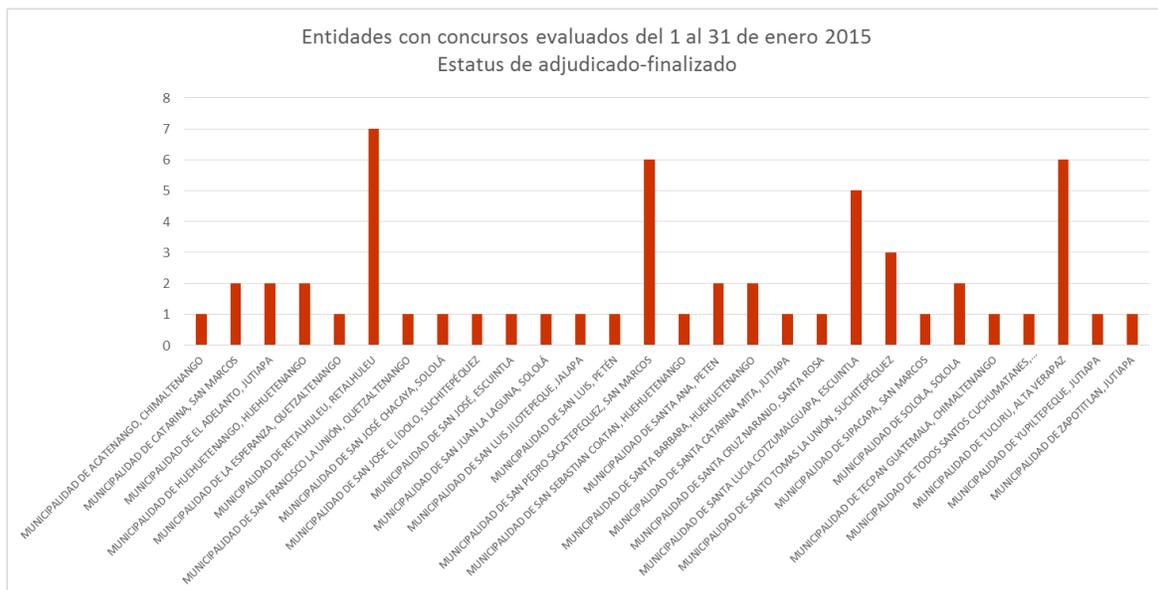

LISTADO DE CONCURSOS EVALUADOS

Con el objeto de que se pueda visualizar la fidelidad de los datos con respecto a entidades y concursos proporcionados en el presente informe, se adjunta la versión original del listado de concursos en Guatecompras, que fue generado al realizar la búsqueda de concursos de acuerdo a los parámetros de búsqueda seleccionados. Para ver el listado en mención ir a anexo 1).

FICHAS TÉCNICAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CoST

Con el objeto de evaluar si las entidades que están obligadas a dar cumplimiento a los Indicadores CoST, se encuentran para el efecto, empleando correctamente el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –Guatecompras- específicamente en la categoría de construcción, de acuerdo a la Resolución 01-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, se analizaron cincuenta y seis concursos seleccionados de acuerdo a los parámetros de búsqueda establecidos, y en para cada uno de los casos, se generó una ficha técnica, después de superados los nueve pasos de la metodología establecida, la cual permite conocer si la entidad, publicó o no público los Indicadores CoST que le correspondían para las etapas de pre contrato y post contrato durante el periodo de evaluación. Para realizar una revisión de las fichas en mención ir a anexo 2.

GRAFICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CoST

En las siguientes gráficas se puede visualizar el porcentaje de divulgación de Indicadores CoST obtenido por cada entidad con concursos publicados en Guatecompras, tanto para la etapa de pre contrato como para la etapa de contrato.



Catorce de los veintiocho concursos reportan un porcentaje mayor en la divulgación de indicadores CoST para la etapa de precontrato.

Diez de los veintiocho concursos reportan un porcentaje mayor en la divulgación de indicadores CoST para la etapa de contrato.

Cuatro de los veintiocho concursos reportan igual porcentaje de cumplimiento para los indicadores de precontrato y contrato.

Nivel de Cumplimiento por Entidad de Adquisición para las Etapas de Pre-Contrato y Contrato

Monitoreo en el Portal de Guatecompras para los concursos Adjudicados en enero 2015

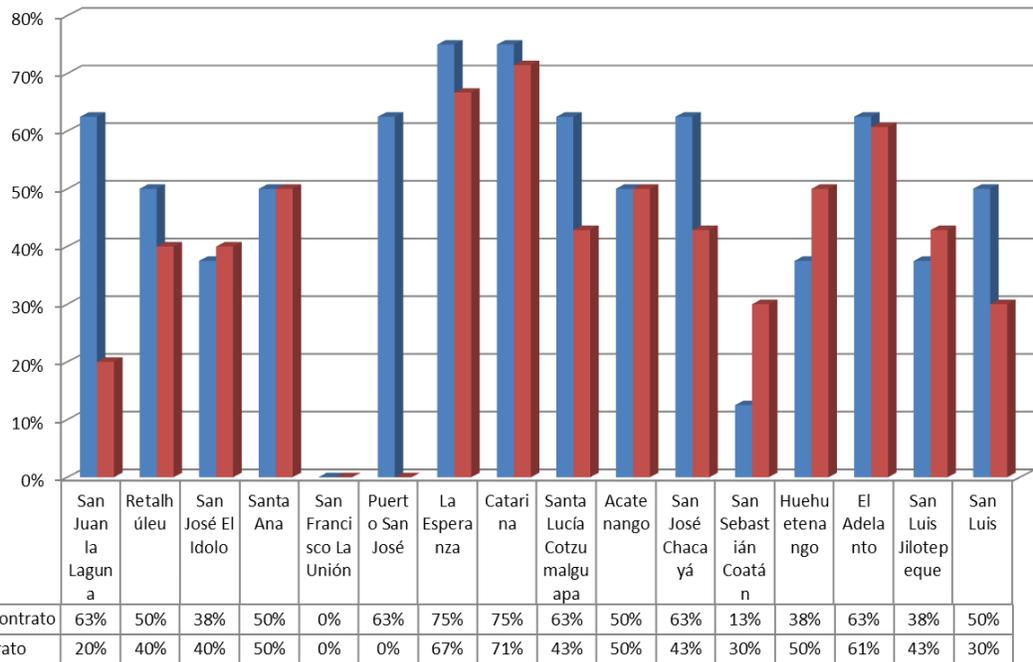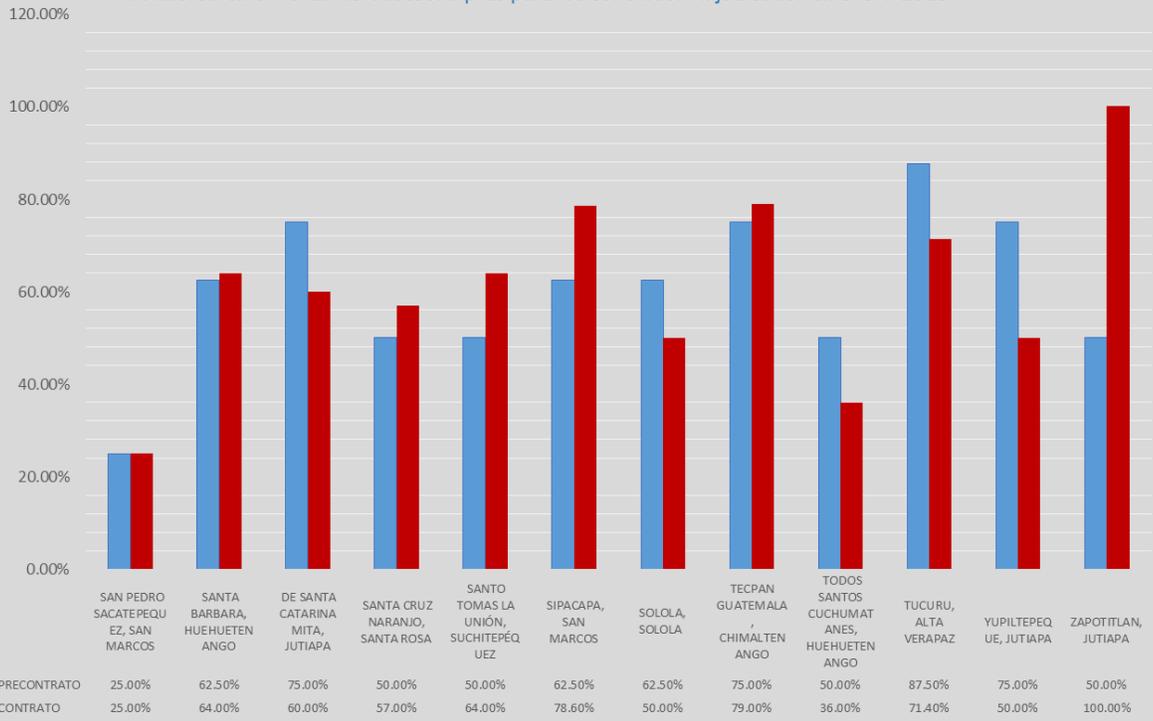

RESULTADOS DEL MONITOREO DE CONCURSOS

El monitoreo se realizó del 12 al 20 de febrero para los concursos que fueron publicados en el Portal del 1 al 31 de enero de 2015. En el monitoreo de cumplimiento de publicación de documentos requeridos por los Indicadores CoST, se detectaron los siguientes comportamientos de las entidades de adquisición monitoreadas:

-Se publicaron 56 concursos bajo el régimen de cotización por 28 municipalidades del país.

-Para la Fase de Proyecto Identificación, frecuentemente no se incluyen las especificaciones técnicas contenidas en el indicador 1.

-Para los indicadores 2, 3 y 4 (propósito, localización y beneficiarios) que los contiene la ficha del SNIP, en varios concursos aunque se identificaba la ficha no contenía la información.

-Para la Fase del Proyecto Proceso de contratación del diseño del Proyecto, que contiene los indicadores 9 y 10 (proceso de oferta y nombre del consultor principal del diseño), se publicó frecuentemente documentación que no corresponde a la naturaleza de los indicadores, como por ejemplo: planos o cuadros de trabajo.

-Algunas entidades abusan de mala práctica, al publicar documentación errónea, sin contenido, documentación repetida que corresponde a otros indicadores, incompleta, etc.

-Muy frecuente que las entidades para la Fase del Proyecto Detalle del contrato de supervisión, no se describe el indicador 17 (trabajo y alcances de la supervisión) y nunca se publicó documentación para el indicador 18 (programa de trabajo de supervisión).

-Para las entidades que publicaron el contrato y que corresponde a la Fase del Proyecto Detalles del Contrato de las obras, algunas veces cumplieron con publicar el indicador 22 (programa de trabajo aprobado al ejecutor).

-El promedio de publicación de documentación requerida para los indicadores CoST de la etapa de Pre Contrato fue de 59%.

-El promedio de publicación de documentación requerida para los indicadores CoST de la etapa de Contrato fue de 54%.

-Solamente dos entidades cumplieron con publicar documentación que requiere el indicador No. 5, Estudio de Viabilidad.

-Se obtuvo un bajo nivel de cumplimiento en publicación de documentación por parte de las entidades y se percibe una alta debilidad en la calidad de la información publicada.

RECOMENDACIONES

-Solicitar a la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas (DNCAE), programar que al ingresar un concurso en la categoría de construcción, el sistema alerte a la Entidad de Adquisición el requerimiento de cumplimiento de los indicadores CoST, según la Resolución 01-2014.

-Solicitar a la DNCAE, explorar alternativas que permitan la identificación y discriminación de documentos que se requieren para la satisfacción de cada indicador CoST.

-En el marco del Convenio Interinstitucional de Acción contra la Corrupción suscrito por la Comisión Presidencial, crear una línea de trabajo directa con la Contraloría General de Cuentas a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del Artículo 20, inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y la Resolución 01-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas.

-Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades ejecutoras por medio de la organización de capacitaciones que se desarrollen conjuntamente con la DNCAE.

-A razón de los resultados obtenidos se recomienda dar seguimiento a la coordinación con el MARN y SEGEPLAN, en concordancia al cumplimiento de la Resolución 01-2014.

ANEXOS

-Anexo 1- Listado de Concursos Evaluados

-Anexo 2- Fichas Técnicas de Cumplimiento de los Indicadores CoST

FUENTES CONSULTADAS

www.guatecompras.gob.gt

www.transparencia.gob.gt

www.costguatemala.org

www.constructiontransparency.org

Anexo 1

Listado de Concursos Evaluados

48 concursos consultados				
	Fecha de publicación ▼	Descripción	Modalidad	Monto
1	3794075	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA	Cotización	549,350.00
	18.feb.2015	OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN		
	03.mar.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA TIERRA COLORADA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BOBEDA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA		
	Terminado adjudicado			
2	3795764	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	Cotización	649,475.90
	17.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ		
	02.mar.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERÍO EL PALOMAR, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO. 		
	Terminado adjudicado			
3	3800008	MUNICIPALIDAD DE UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO	Cotización	130,484.50
	17.feb.2015	ALCALDIA MUNICIPAL		
	02.mar.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL, ALDEA SAN JOSÉ, UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO		
	Terminado adjudicado			
4	3796132	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO	Cotización	565,000.00
	16.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
	27.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL APERTURA DE CARRETERA PARAJE PLAN CHIQUITO ALDEA SACPIC CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, HUHEUETENANGO		
	Terminado			

	adjudicado			
5	3712974	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	Cotización	264,800.00
	16.feb.2015	TESORERIA MUNICIPAL		
	27.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BAJO ZONA 4, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE		
	Terminado adjudicado			
6	3794628	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA	Cotización	670,400.00
	16.feb.2015	OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN		
	27.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCION LETRINA (S) ALDEA EL RODEO, SECTOR ARRIBA Y COLONIA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA.		
	Terminado adjudicado			
7	3763455	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	Cotización	349,500.00
	13.feb.2015	CONSTRUCCION DE OBRAS MUNICIPALES		
	26.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	Conservación Calles, Aldea Yuxen, Santa Ana Huista, Huehuetenango		
	Terminado adjudicado			
8	3785769	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ	Cotización	267,160.00
	13.feb.2015	OFICINA DE PLANIFICACION		
	26.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	COMPRA DE TUBERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL BOQUERON, JOYABAJ QUICHE		
	Terminado adjudicado			
9	3718603	MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	Cotización	150,000.00
	12.feb.2015	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		
	25.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO PUEBLO VIEJO		
	Terminado adjudicado			
10	3736512	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN	Cotización	114,402.00
	12.feb.2015	OMP FLORES,PETEN		

	26.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MANTENIMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA EL CAOBA A PARCELAMIENTO LA PISTA, FLORES, PETÉN.		
	Terminado adjudicado			
11	3736504	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN	Cotización	310,035.00
	12.feb.2015	OMP FLORES,PETEN		
	26.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MANTENIMIENTO CARRETERA DE TERRACERÍA AGUADAS NUEVAS, EL AGUACATE, LA MARIMBA Y CRUCE SAN CLEMENTE AL BAMBONAL, FLORES, PETÉN.		
	Terminado adjudicado			
12	3736490	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN	Cotización	208,060.99
	12.feb.2015	OMP FLORES,PETEN		
	25.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA MACANCHÉ HACIA PARCELAMIENTO NARANJO AGRIO, FLORES, PETÉN.		
	Terminado adjudicado			
13	3786188	MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS	Cotización	199,584.00
	12.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE CATAR		
	25.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO SIMPLE, CAMINO PRINCIPAL A SECTOR PATAGONIA, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS.		
	Terminado adjudicado			
14	3788822	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA	Cotización	299,980.00
	11.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN		
	24.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CARRETERA (ADOQUINADO) DEL BARRIO SAN PEDRO A BARRIO CRUZ DE MAYO, ALDEA PAJCO, CAMOTAN, CHIQUIMULA		
	Terminado adjudicado			
15	3788407	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA	Cotización	399,950.00
	11.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN		
	24.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CANCHA		

		POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL, CASCO URBANO, CAMOTAN, CHIQUIMULA		
	Terminado adjudicado			
16	3790525	MUNICIPALIDAD DE NAHUALA, SOLOLÁ	Cotización	499,950.00
	11.feb.2015	DIEGO PEDRO CHAN LÓPEZ		
	24.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAC, ALDEA XEJUYUP, NAHUALÁ, SOLOLÁ		
	Terminado adjudicado			
17	3789179	MUNICIPALIDAD DE COMAPA, JUTIAPA	Cotización	559,700.00
	11.feb.2015	TESORERIA		
	24.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CAPARROZA, COMAPA, JUTIAPA		
	Terminado adjudicado			
18	3788156	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Cotización	761,300.00
	11.feb.2015	JUNTA DE COTIZACIONES		
	24.feb.2015	Construcción y materiales afines Transporte, repuestos y combustibles		
	Público	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (CELDA) EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, EN ALDEA EL OREGANO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA).		
	Terminado adjudicado			
19	3631001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Cotización	349,426.00
	11.feb.2015	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP		
	24.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	AMPLIACION INSTITUTO BÁSICO INEB, SAN PEDRO PINULA		
	Terminado adjudicado			
20	3745015	MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Cotización	849,500.00
	11.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD NVA, STA.ROSA		

	24.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.		
	Terminado adjudicado			
21	3768481	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	Cotización	556,742.94
	10.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		
	23.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN TECHO EN PATIO ESCUELA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.		
	Terminado adjudicado			
22	3785319	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	Cotización	481,094.35
	09.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA.		
	20.feb.2015	Construcción y materiales afines Electricidad y aire acondicionado		
	Público	AMPLIACIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN SECTOR PLAN GRANDE, ALDEA YUMANES, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		
	Terminado adjudicado			
23	3567648	MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA	Cotización	617,274.48
	09.feb.2015	UNIDAD DE COMPRAS ALMACEN E INVENTARIO		
	20.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCION SALON TECHO, ALDEA EL CARRIZAL, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA.		
	Terminado adjudicado			
24	3771857	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Cotización	317,900.00
	09.feb.2015	UNIDAD DE COMPRAS		
	23.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIMELB (REGIÓN SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, A.V.		
	Terminado adjudicado			
25	3771520	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	Cotización	319,790.00
	09.feb.2015	UNIDAD DE COMPRAS		

	23.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBAYAL (REGIÓN SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, A.V.		
	Terminado adjudicado			
26	3743500	MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Cotización	232,500.00
	09.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD NVA, STA. ROSA		
	20.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHAPAS A ALDEA SAN ANTONIO, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.		
	Terminado adjudicado			
27	3779343	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ	Cotización	340,977.50
	06.feb.2015	TESORERIA MUNICIPAL		
	19.feb.2015	Construcción y materiales afines Otros tipos de bienes o servicios		
	Público	MEJORAMIENTO CARRETERA (BALASTRO) DE PATUYA AL SECTOR XEABAJ, ALDEA TZUNUNÁ, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA.		
	Terminado adjudicado			
28	3779483	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ	Cotización	189,351.80
	06.feb.2015	TESORERIA MUNICIPAL		
	19.feb.2015	Construcción y materiales afines Otros tipos de bienes o servicios		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL HOTEL YAC HACIA EL PUENTE PATUYA, ALDEA TZUNUNÁ, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA.		
	Terminado adjudicado			
29	3770400	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ	Cotización	571,020.00
	06.feb.2015	SECRETARÍA MUNICIPAL		
	19.feb.2015	Construcción y materiales afines Otros tipos de bienes o servicios		
	Público	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR Y MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LA TOMA I, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLÁ.		
	Terminado adjudicado			
30	3748286	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SAN MARCOS	Cotización	674,400.00

	06.feb.2015	ENCARGADO DE COMPRAS MUNICIPALES		
	19.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO TECHO MINIMO MUNICIPIO DE SAN LORENZO, SAN MARCOS 2015		
	Terminado adjudicado			
31	3772101	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETÉN	Cotización	714,703.23
	06.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETEN		
	19.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS LAGARTOS NUEVO PROGRESO HACIA CASERIO NUEVA VERAPAZ, SANTA ANA, PETEN		
	Terminado adjudicado			
32	3772039	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETÉN	Cotización	419,920.64
	06.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETEN		
	19.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA EL MANGO HACIA EL LIMITE ALDEA EL JULEQUE, SANTA ANA, PETEN		
	Terminado adjudicado			
33	3719707	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ	Cotización	442,090.00
	05.feb.2015	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN		
	18.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL DESIERTO, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ		
	Terminado adjudicado			
34	3771970	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETÉN	Cotización	599,610.00
	05.feb.2015	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETEN		
	18.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTERRICO, SANTA ANA, PETEN		
	Terminado adjudicado			
35	3771717	MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA	Cotización	504,000.00
	05.feb.2015	TESORERIA MUNICIPAL		

	18.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL DOCTOR, CABECERA MUNICIPAL, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA.		
	Terminado adjudicado			
36	3761835	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, HUEHUETENANGO	Cotización	649,798.00
	04.feb.2015	TESORERÍA MUNICIPAL		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, CANTÓN MÉNDEZ, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.		
	Terminado adjudicado			
37	3765210	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, HUEHUETENANGO	Cotización	899,725.00
	04.feb.2015	TESORERÍA MUNICIPAL		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCIÓN PARQUE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.		
	Terminado adjudicado			
38	3761355	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, HUEHUETENANGO	Cotización	749,900.00
	04.feb.2015	TESORERÍA MUNICIPAL		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA ONLAJ Y CASERÍO TIERRA COMÚN, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.		
	Terminado adjudicado			
39	3760472	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, HUEHUETENANGO	Cotización	699,681.01
	04.feb.2015	TESORERÍA MUNICIPAL		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), CANTÓN MÉNDEZ, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.		
	Terminado adjudicado			
40	3742423	MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	Cotización	234,200.00
	04.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD NVA, STA. ROSA		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE AL CENTRO ALDEA ESPITIA BARRERA, NUEVA		

		SANTA ROSA, SANTA ROSA.		
	Terminado adjudicado			
41	3735060	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA	Cotización	800,000.24
	04.feb.2015	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA DE BRECHA ALDEA EL MATAZANO A SECTOR MONTAÑA PEÑA DEL CABRO, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA		
	Terminado adjudicado			
42	3767388	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN	Cotización	387,500.00
	04.feb.2015	FREDY LOPEZ MARTINEZ		
	17.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICORRAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES.		
	Terminado adjudicado			
43	3766136	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA	Cotización	224,600.00
	04.feb.2015	TESORERIA MUNICIPAL		
	25.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PUENTE UTENA - NANCINTA, FASE IX, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA		
	Terminado adjudicado			
44	3756890	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	Cotización	309,000.00
	03.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
	18.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO TOJ CHOL, ALDEA BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
	Terminado adjudicado			
45	3756882	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	Cotización	345,000.00
	03.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
	18.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESTANCIA, ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
	Terminado			

	adjudicado			
46	3756874	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	Cotización	154,242.50
	03.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
	16.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO, CASERIO NUEVO PALMIRA, ALDEA EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
	Terminado adjudicado			
47	3756866	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO	Cotización	309,475.60
	03.feb.2015	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		
	16.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, FASE II ALDEA LOS GONZALEZ, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
	Terminado adjudicado			
48	3759822	MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO	Cotización	299,520.80
	02.feb.2015	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		
	13.feb.2015	Construcción y materiales afines		
	Público	MEJORAMIENTO CALLE , 2DA CALLE ENTRE 1A. Y 5A. AVENIDA, DE LA ZONA 1, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO		
	Terminado adjudicado			

Anexo 2

Fichas Técnicas de Cumplimiento de los Indicadores CoST

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3794075
Fecha de análisis:	6 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad			X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto		X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas		X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3794628
Fecha de análisis:	9 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3795764
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X		
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3800008
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X
		2. Propósito	X	
		3. Localización		X
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas		X
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista		
		20. Precio del Contrato		
		21. Trabajos y alcance de las obras		
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
		28. Total de pagos realizados		
		29. Alcance real de la obra		
		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3796132
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X		
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	X		
		20. Precio del Contrato	X		
		21. Trabajos y alcance de las obras	X		
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3712974
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito		X	
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios		X	
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X		
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X		
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X		
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3763455
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito		X	
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X	
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3785769
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X		
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	X		
		20. Precio del Contrato	X		
		21. Trabajos y alcance de las obras			X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3718603
Fecha de análisis:	11 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito		X	
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X		
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3736512
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad	X		
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X		
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X		
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3736504
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad	X		
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X		
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X		
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETÉN
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3736490
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad	X		
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X		
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X		
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3786188
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto		X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X	
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión		X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas		X	
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas		X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión		X	
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista		X	
		20. Precio del Contrato		X	
		21. Trabajos y alcance de las obras		X	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE NAHUALA, SOLOLÁ
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3790525
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X		
		17. Trabajos y alcance de la supervisión	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	X		
		20. Precio del Contrato	X		
		21. Trabajos y alcance de las obras	X		
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE COMAPA, JUTIAPA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3789179
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito		X	
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios		X	
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto		X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3788156
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3631001
Fecha de análisis:	12 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X	
		7. Presupuesto		X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X	
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión		X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3745015
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad			X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto		X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas		X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3743500
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas		X	
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas		X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	ADJUDICADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3742423
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto	X		
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X		
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas		X	
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas		X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista			
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3761835
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios		X	
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión		X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas		X	
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X	
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista		X	
		20. Precio del Contrato		X	
		21. Trabajos y alcance de las obras			X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3765210
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X	
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista		X	
		20. Precio del Contrato		X	
		21. Trabajos y alcance de las obras			X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3761355
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X	
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista		X	
		20. Precio del Contrato		X	
		21. Trabajos y alcance de las obras			X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidad Analizada:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	CONTRATADO, PRE CONTRATO, CONTRATO. NOG 3760472
Fecha de análisis:	13 DE MARZO DE 2015
Nombre del Analista:	ING. JULIO M. URIAS B.

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización		X	
		4. Beneficiarios		X	
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión		X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas			X
		14. Lista de oferentes		X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X	
		17. Trabajos y alcance de la supervisión			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista		X	
		20. Precio del Contrato		X	
		21. Trabajos y alcance de las obras			X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO / PRECONTRATO - CONTRATO ADJUDICADO	NOG	3788822

Fecha de análisis:	12-mar-15
--------------------	-----------

Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac
----------------------	--------------------

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad	X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato	X	
		21. Trabajos y alcance de las obras	X	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
	8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
		27. Precio actualizado del contrato		
	10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
		29. Alcance real de la obra		

		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada: MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA

Fase del Proyecto en la que se encuentra: TERMINADO-ADJUDICADO PRECONTRATO-CONTRATO NOG 3788407

Fecha de análisis: 12-mar-15

Nombre del Analista: Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad	X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato	X	
		21. Trabajos y alcance de las obras	X	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X

8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3768481
Fecha de análisis:	17/02/2015		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión			X

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas		X
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas		X
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras	X	
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3785319
Fecha de análisis:	12-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	

	4. Beneficiarios	X	
	5. Estudio de Viabilidad		X
2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X
	7. Presupuesto	X	
	8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
	10. Nombre del consultor principal del diseño		X
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas		X
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras		X
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

Ficha Técnica de Publicación de

Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción

2015

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO NOG 3567648

Fecha de análisis:

13/03/2015

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X	
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X	
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
		17. Trabajo y alcance de las supervision		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato		X
		21. Trabajos y alcance de las obras		X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
	8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
		27. Precio actualizado del contrato		
	10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
		29. Alcance real de la obra		

		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3771857
Fecha de análisis:	13/03/2015		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad	X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas		X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato	X	
		21. Trabajos y alcance de las obras		X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	X	

8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3771520
Fecha de análisis:	13/03/2015		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad	X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas		X
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
	17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras		X
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	X	
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO

NOG

3779343

Fecha de análisis:

13/03/2015

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X
		2. Propósito	X	

	3. Localización	X	
	4. Beneficiarios		X
	5. Estudio de Viabilidad		X
2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X
	7. Presupuesto		X
	8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
	10. Nombre del consultor principal del diseño		X
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato		
	21. Trabajos y alcance de las obras		
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

Ficha Técnica de Publicación de

Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción

2015

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO

NOG

3779483

Fecha de análisis:

13/03/2015

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios		X	
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajo y alcance de las supervision			X
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X		
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
		27. Precio actualizado del contrato			
	10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			

		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLÁ		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3770400
Fecha de análisis:	14-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	X	
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
		17. Trabajo y alcance de las supervision		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato		X
		21. Trabajos y alcance de las obras		X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X

8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SAN MARCOS		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3748286
Fecha de análisis:	21-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones		X	
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión		X	

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
	17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista		
	20. Precio del Contrato		
	21. Trabajos y alcance de las obras		
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETÉN

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO

NOG

3772101

Fecha de análisis:

14/03/2015

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	

	3. Localización	X	
	4. Beneficiarios	X	
	5. Estudio de Viabilidad		X
2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
	7. Presupuesto	X	
	8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
	10. Nombre del consultor principal del diseño		X
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X	
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato		X
	21. Trabajos y alcance de las obras		X
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETÉN

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO

NOG

3772039

Fecha de análisis:

14-mar-15

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X	
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de las supervision		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato		X
		21. Trabajos y alcance de las obras		X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
	8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
		27. Precio actualizado del contrato		
	10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
		29. Alcance real de la obra		
		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO

NOG

3719707

Fecha de análisis:

14/03/2015

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X	
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato	X	
		21. Trabajos y alcance de las obras	X	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
	8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		

		26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras		27. Precio actualizado del contrato		
		28. Total de pagos realizados		
		29. Alcance real de la obra		
		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

0

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, PETÉN		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3771970
Fecha de análisis:	14/03/2015		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X	
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de las supervision		X
		18. Programa de trabajo		X

7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato		X
	21. Trabajos y alcance de las obras		X
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3771717
Fecha de análisis:	14/03/2015		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X

3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta	X	
	10. Nombre del consultor principal del diseño	X	
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
	17. Trabajo y alcance de las supervision	X	
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras	X	
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de tranparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3735060
Fecha de análisis:	16-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios		X	
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X		
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajo y alcance de las supervisión	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X		
		20. Precio del Contrato			
		21. Trabajos y alcance de las obras			
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
	10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato			
		28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			
		30. Programa actualizado			
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

Ficha Técnica de Publicación de

Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción

2015

Entidades Analizada:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN

Fase del Proyecto en la que se encuentra:

TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO

NOG

3767388

Fecha de análisis:

16-mar-15

Nombre del Analista:

Ing. Sonia Ixquiac

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ	
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X		
		2. Propósito	X		
		3. Localización	X		
		4. Beneficiarios	X		
		5. Estudio de Viabilidad		X	
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento			X
		7. Presupuesto			X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)			X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta			X
		10. Nombre del consultor principal del diseño			X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas			X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X		
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X		
		14. Lista de oferentes	X		
		15. Informes de evaluación de las ofertas			X
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato			X
		17. Trabajo y alcance de las supervision	X		
		18. Programa de trabajo			X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X		
		20. Precio del Contrato	X		
		21. Trabajos y alcance de las obras			X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor			X
	8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación			
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios			
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios			
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista			
		27. Precio actualizado del contrato			
	10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados			
		29. Alcance real de la obra			

		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3766136
Fecha de análisis:	16-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento		X
		7. Presupuesto	X	
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	X	
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
		17. Trabajo y alcance de la supervisión		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato		
		21. Trabajos y alcance de las obras		
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		

8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3756890
Fecha de análisis:	19-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto		X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X	
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras	X	
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	X	
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3756882
Fecha de análisis:	19-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	

	3. Localización	X	
	4. Beneficiarios	X	
	5. Estudio de Viabilidad		X
2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
	7. Presupuesto		X
	8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
	10. Nombre del consultor principal del diseño	X	
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras	X	
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	X	
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

Ficha Técnica de Publicación de

Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción

2015

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3756874
Fecha de análisis:	20-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto		X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X	
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
		17. Trabajo y alcance de las supervision		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato	X	
		21. Trabajos y alcance de las obras	X	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	X	
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
		25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
		27. Precio actualizado del contrato		
	10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
		29. Alcance real de la obra		

		30. Programa actualizado		
		31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3756866
Fecha de análisis:	20-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto		X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño	X	
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
		14. Lista de oferentes	X	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
	6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato		X
		17. Trabajo y alcance de las supervision		X
		18. Programa de trabajo		X
	7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
		20. Precio del Contrato	X	
		21. Trabajos y alcance de las obras	X	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	X	

8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato		
	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.

**Ficha Técnica de Publicación de
Indicador de transparencia en el Sector de la Construcción
2015**

Entidades Analizada:	MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO		
Fase del Proyecto en la que se encuentra:	TERMINADO ADJUDICADO, PRECONTRATO Y CONTRATO	NOG	3759822
Fecha de análisis:	21-mar-15		
Nombre del Analista:	Ing. Sonia Ixquiac		

UNIDAD EJECUTORA	FASE DEL PROYECTO	INDICADOR	PUBLICÓ	NO PUBLICÓ
	1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	X	
		2. Propósito	X	
		3. Localización	X	
		4. Beneficiarios	X	
		5. Estudio de Viabilidad		X
	2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	X	
		7. Presupuesto		X
		8. Costo estimado del Proyecto (precio base)		X
	3. Proceso de contratación del diseño del Proyecto	9. Procesos de oferta		X
		10. Nombre del consultor principal del diseño		X
	4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas		X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	
	14. Lista de oferentes	X	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	X	
6. Detalle del contrato de supervisión	16. Precio del Contrato	X	
	17. Trabajo y alcance de las supervision		X
	18. Programa de trabajo		X
7. Detalles del Contrato de la obra	19. Nombre del Contratista	X	
	20. Precio del Contrato	X	
	21. Trabajos y alcance de las obras	X	
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor		X
8. Ejecucion del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación		
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razon de los cambios		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista		
	27. Precio actualizado del contrato		
10. Post- contrato de las obras	28. Total de pagos realizados		
	29. Alcance real de la obra		
	30. Programa actualizado		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto		

Nota Importante: Este formulario refiere a publicación de información. La publicación de documentos en el Portal de Guatecompras, queda a responsabilidad de la entidad, así como la calidad y veracidad en el contenido de los mismos. Por lo que el contenido de los documentos adjuntos está sujeto a evaluaciones pertinentes de acuerdo a los establecido por la ley. El presente documento NO representa una constancia de cumplimiento.
